District 2 Year 4 Phase I (Roadways)

Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows.

Period Highlight: 5

Plan Duration | Actual Start | % Complete | Actual (beyond Plan) | % Complete (beyond plan)

Final 2/1/2021

ACTIVITY	PLAN START	PLAN DURATION	ACTUAL START	ACTUAL DURATION	PERCENT COMPLETE
Notice To Proceed	6	23	6	7	13%
N. G St. (Lucerne Ave. to 3rd Ave. N.)	7	7	7	6	50%
N. G St. (9th Ave. N. to 10th Ave. N.)	8	5	8	5	50%
9th Ave. N. (N. G to N. H St.)	8	5	8	5	50%
N. H St. (2nd Ave. N. to 5th Ave. N.)	11	8			0%
4th ave. N. (N. G St. to N. H St.)	14	5			0%
6th Ave. N. (N. G St. to N. H St.)	14	9			0%
N. East Coast St. (S. of 20th Ave. N. to N. of 24th Ave. N.)	20	5			0%
Substantial Completion	25	4			0%
Final Completion		28			0%

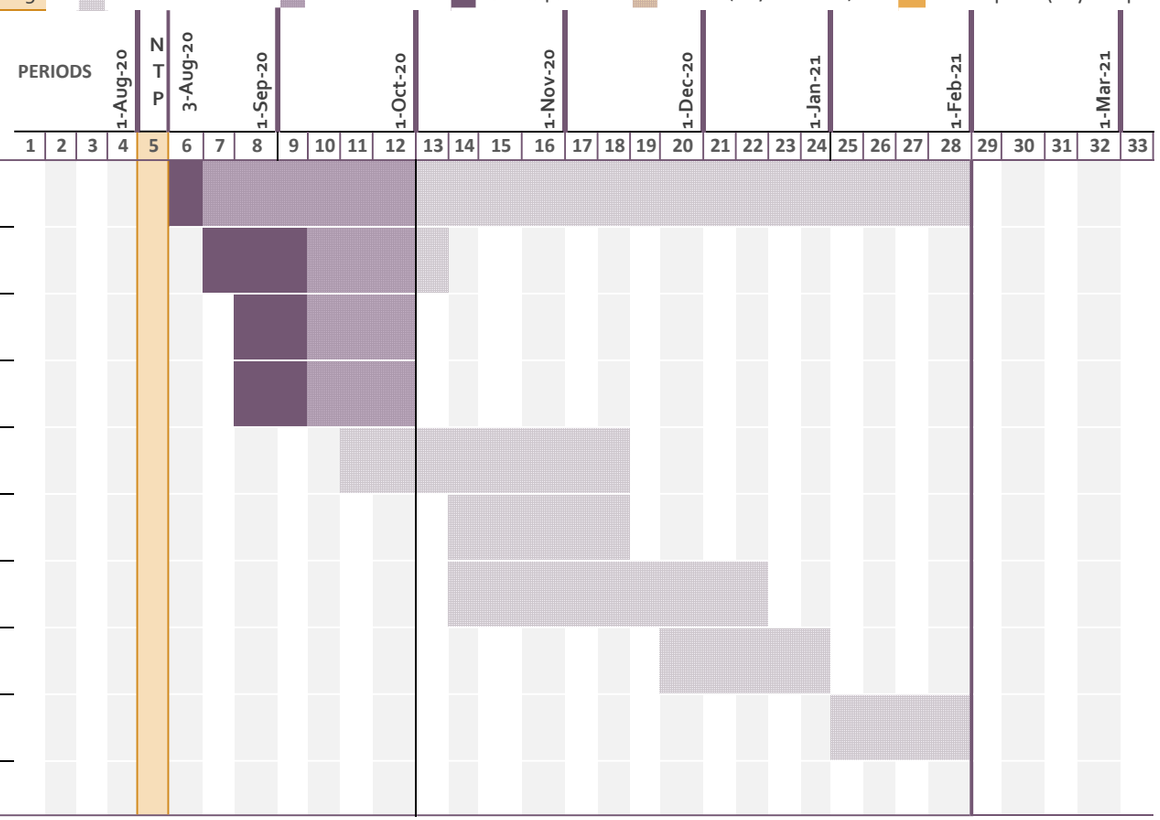

Roadway segments in project:

N. G St. (Lucerne Ave. to 3rd Ave. N./9th Ave. N. to 10th Ave. N.)
9th Ave. N. (N. G St. to N. H St.)
N. H St. (2nd Ave. N. to 5th Ave. N.)
4th ave. N. (N. G St. to N. H St.)
6th Ave. N. (N. G St. to N. H St.)
N. East Coast St. (S. of 20th Ave. N. to N. of 24th Ave. N.)

Updated: 10/1/2020
